



Proyecto de mejora de capital

Actualizaciones 06-12-2025

Orden del día

Capital Yo mejoras

- Capital 2024

Proyecto

- Fase 1A
- Fase 1B
- Fase 2
- Fase 3

- Proyecto de renovación de piscina

- Sistema de megafonía y reloj/altavoz

Proyecto

- Proyecto de puertas y rampas de la escuela primaria Taft
- Proyecto de ventanas de la cafetería de la escuela secundaria

Proyecto de capital 2024

1



Capital 2024

Proyecto – Fase 1A

Escuela primaria Little Britain
Escuela

- Alcance del trabajo:
 - Retirada del tejado existente
Sistema sobre la zona de entrada principal.
 - Sustitución por un nuevo sistema de techado
para cumplir con los requisitos del código
energético vigente.
 - Modificaciones en los bordes de techos metálicos,
contrachapados metálicos, bordillos
para equipos mecánicos, penetraciones de
tuberías y penetraciones eléctricas.

Capital 2024

Proyecto – Fase 1A

Escuela primaria Little Britain
Escuela

- Aprobación del SED: Completa
- Subasta: Completada
- Inicio de la construcción (previsto): 1 de julio de 2025
- Finalización de la construcción (prevista): 15 de agosto, 2025



Capital 2024

Proyecto – Fase 1B

Washingtonville Middle
Escuela Washingtonville
Prensa de la escuela secundaria
Caja

- Alcance de
Trabajar:

- Campo deportivo de césped artificial multiusos
- Pista de atletismo
- Campo de béisbol – Banquillos,
Jaulas de protección y de bateo
- Campos de entrenamiento superiores – Drenaje
Mejoras en el riego
- Campo de saltos y lanzamientos
Mejoras en el área del evento
- Nueva cabina de prensa
- Instalación de toldos para patios
- Reparación de acabados de paredes y suelos
- Sustitución de ascensores



Capital 2024

Proyecto – Fase 1B

Washingtonville Middle
Escuela Washingtonville
Prensa de la escuela secundaria
Caja

- Aprobación del SED: Completa
- Licitación (prevista): julio/agosto 2025
- Inicio de la construcción (previsto): 15 de octubre de 2025
- Finalización de la construcción (prevista): 1 de noviembre, 2026





Capital 2024

Proyecto – Fase

2

Washingtonville Middle
Escuela Washingtonville
Escuela secundaria Little Britain
Ronda de la escuela primaria
Escuela Primaria Hill Taft
Escuela primaria

- Alcance del trabajo:

- Escuela Secundaria Washingtonville
Escuela
 - Sustitución de puertas
- Escuela Secundaria Washingtonville
Escuela
 - Sustitución de puertas
- Escuela Primaria Little Britain
 - Sustitución de puertas
 - Sustitución de ventiladores de extracción
 - Sustitución de calentadores de agua
 - Reemplazar el sistema séptico
 - Mejorar los parques infantiles/zonas de juego
- Áreas



Capital 2024

Proyecto – Fase

2

Washingtonville Middle
Escuela Washingtonville
Escuela secundaria Little Britain
Ronda de la escuela primaria
Escuela Primaria Hill Taft
Escuela primaria

- Alcance de

- Trabajar:

- Escuela Primaria Round Hill

- Sustitución de puertas
 - Sustitución de calentadores de agua
 - Reemplazar el equipo de preparación de alimentos
 - Mejorar los parques infantiles/zonas de juego

- ~~Escuela~~ Escuela Primaria Taft

- Sustitución de puertas
 - Mejoras en la calefacción de las aulas
 - Reducción y reemplazo de pisos
 - Reemplazar el equipo de preparación de alimentos
 - Reemplazar la cámara frigorífica y
Congelador

- Mejorar los parques infantiles/áreas de juego




Capital 2024

Proyecto – Fase 2

Washingtonville Middle
Escuela Washingtonville
Escuela secundaria Little Britain
Ronda de la escuela primaria
Escuela Primaria Hill Taft
Escuela primaria

- Aprobación del SED (prevista): junio 2025
- Licitación (prevista): septiembre/octubre de 2025
- Inicio de la construcción (previsto): Noviembre. 2025
- Finalización de la construcción (prevista): enero. 2027




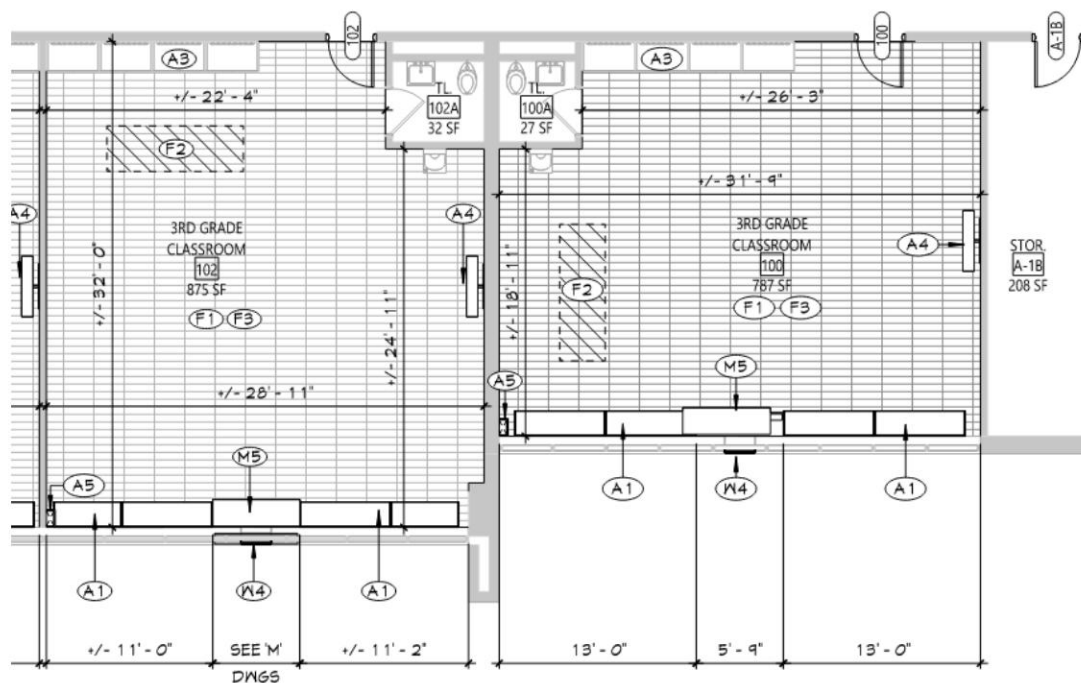

Escuela primaria Taft

Escuela

- Mejoras en la calefacción de las aulas

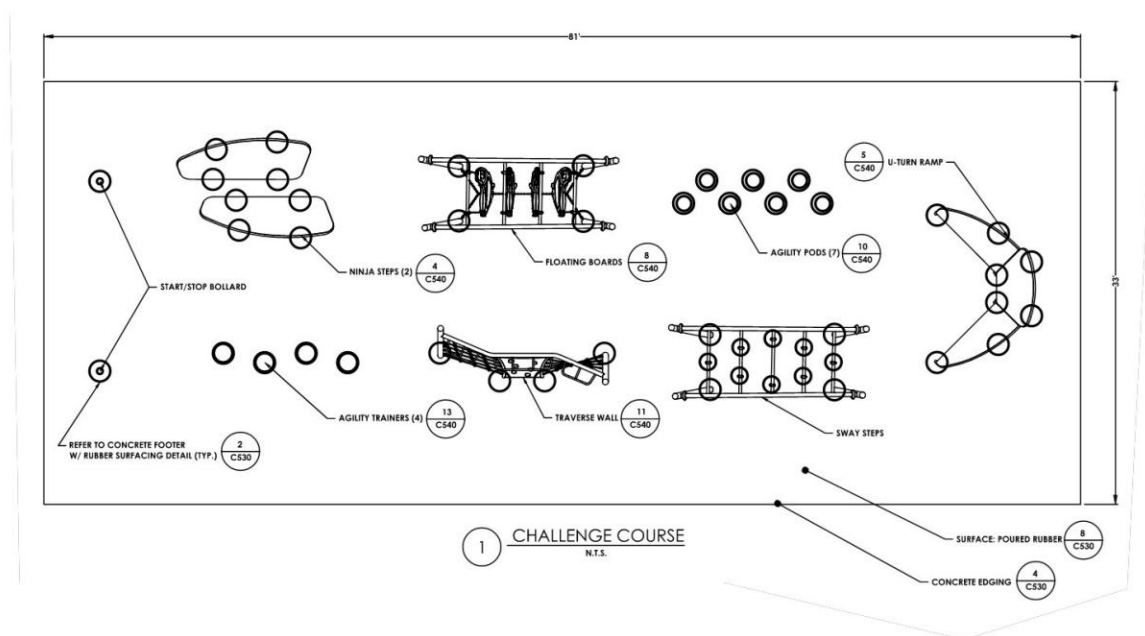

Escuela Primaria Little Britain

- Parque infantil propuesto

Equipo

Capital 2024

Proyecto – Fase

3

Washingtonville Middle Escuela Washingtonville

Escuela secundaria

- Alcance de
Trabajar:
 - Escuela Secundaria Washingtonville
 - Calentador de agua y sistema de climatización
Sustitución de unidades
 - Sustitución de
Cuadros eléctricos
y paneles
 - Película de seguridad en la cafetería
Windows
 - Sustitución de la alarma contra incendios
y monóxido de carbono
Sistemas
 - Renovar los baños y
Vestuarios de la piscina
 - Reemplazar el equipo de preparación de alimentos
 - Mejoras en la piscina que incluyen:



Capital 2024

Proyecto – Fase

3

Washingtonville Middle Escuela Washingtonville

Escuela secundaria

- Alcance de
Trabajar:
 - Escuela Secundaria Washingtonville
 - Sustitución de ventanas de madera en escaleras y gimnasio
 - Reemplazar el equipo de preparación de alimentos
 - Reemplazar la cámara frigorífica y el congelador
 - Eliminación y reemplazo de pisos de cocina
 - Estacionamiento, entrada para vehículos, cercado, Bordillos y aceras mejoras



Capital 2024

Proyecto – Fase


3

Washingtonville Middle
Escuela Washingtonville

Escuela secundaria

- Aprobación del SED (prevista): agosto. 2025
- Licitación (prevista): enero/febrero de 2026
- Inicio de la construcción (previsto): junio de 2026
- Finalización de la construcción (prevista): septiembre. 2027



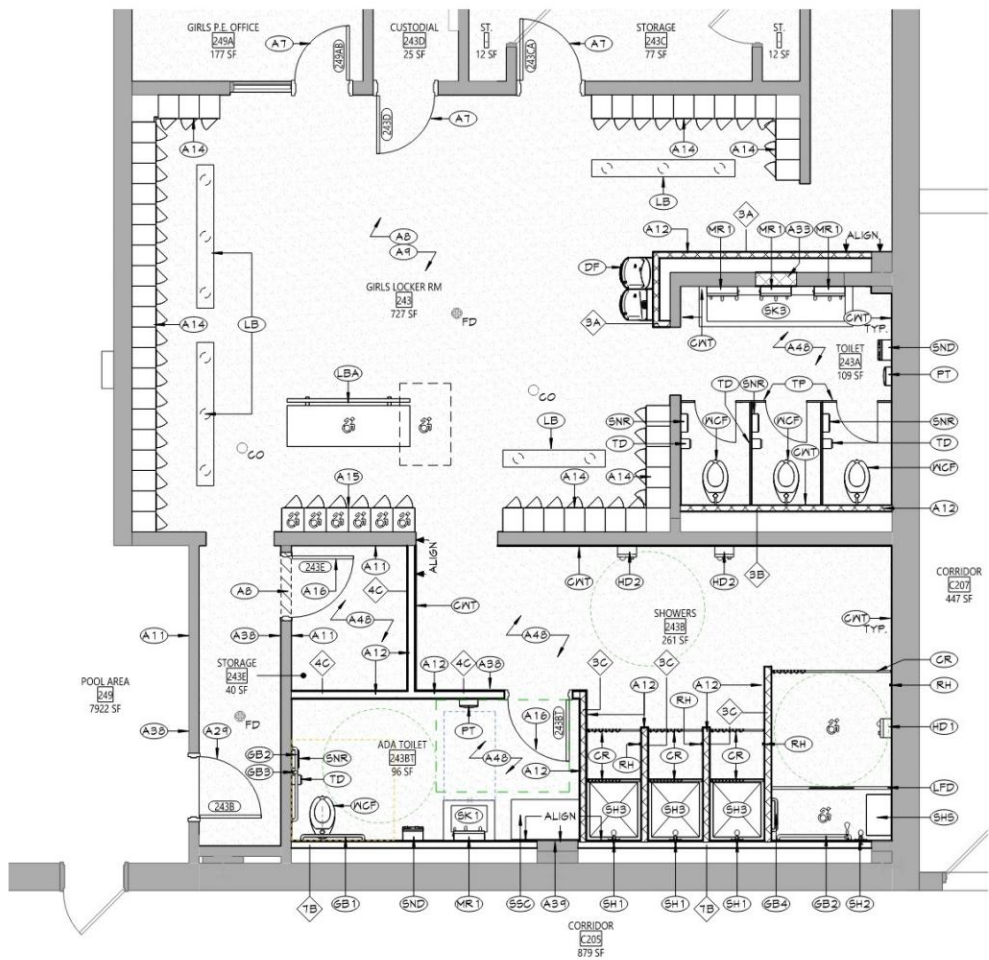


Escuela secundaria de Washingtonville

Escuela

- Vestuario de la piscina


Reformas

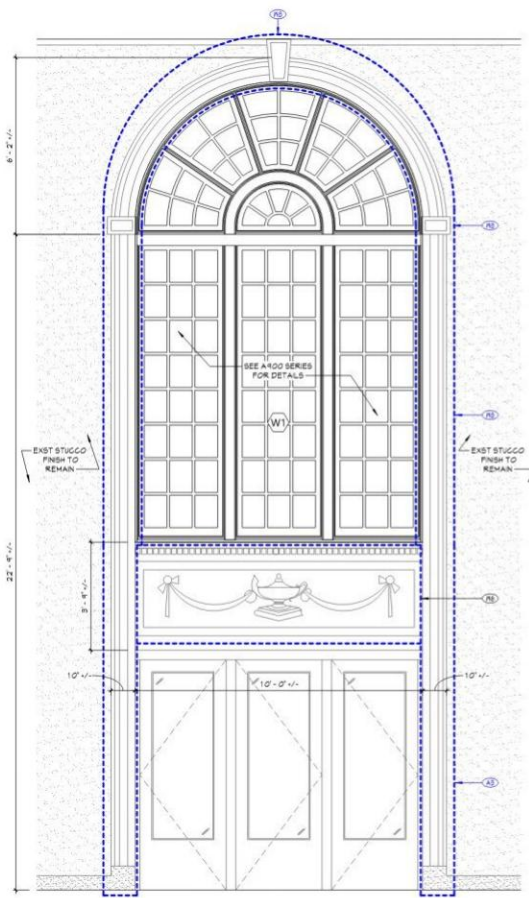

Escuela Secundaria Washingtonville •

Ventana de madera

Repuestos

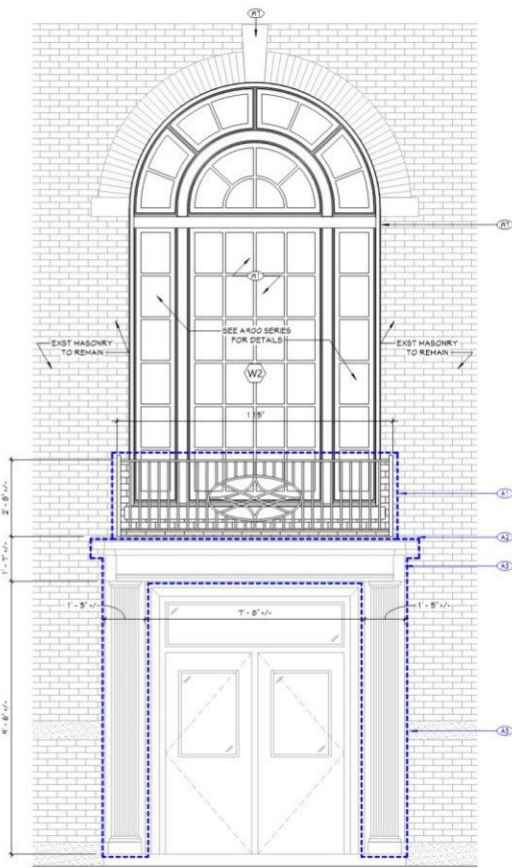

Renovación de piscinas

Proyecto

2



Piscina Renovación Proyecto n

Escuela secundaria de Washingtonville
Escuela

- Alcance de
Trabajar:

- Drenaje principal y secundario

Reemplazo de desagüe

- Sustitución de la línea de llenado

- Seleccione la opción de reemplazo de la piscina

Terraza, paredes de la piscina y losa de la piscina

- Sustitución de puertas

- Reacabado de la terraza de la piscina y otros elementos seleccionados

Renovación de paredes de piscinas y piscinas

Losa

- Nuevas marcas de profundidad y prohibición de buceo

- Sustitución de baldosas de techo

- Reemplazo de la tapa del desagüe de la terraza



Piscina Renovación Proyecto

Escuela secundaria de Washingtonville
Escuela

- Aprobación del NYSED: Completa
- Licitación (Nueva licitación con la Fase 3): enero/febrero de 2026
- Inicio de la construcción (previsto): 1 de abril de 2026
- Finalización de la construcción (prevista): 31 de julio, 2026



Mecánica pública y Reloj/Altavoz Proyecto

3



Mecánica pública y

Reloj/Altavoz Proyecto

Fase 1 – Escuela secundaria y
Escuela secundaria

- Alcance del trabajo – Fase 1:
 - Instalación de nuevos sistemas de megafonía, incluyendo relojes y altavoces, en la escuela secundaria y la escuela intermedia.
 - Integración con el Distrito-
Sistemas de notificación amplios.
- Aprobación del NYSED: Completa
- Plazo de presentación de ofertas: junio de 2025
- Inicio de la construcción: 1 de julio de 2025
- Finalización de la construcción: 1 de septiembre
2025



Mecánica pública y

Reloj/Altavoz Proyecto

Fase 2 – Primaria Escuelas

- Alcance del trabajo – Fase 2:
 - Instalación de nuevos sistemas de megafonía, incluyendo relojes y altavoces, en todas las escuelas primarias.
 - Integración con el Distrito-
Sistemas de notificación amplios.
- Aprobación del NYSED (prevista): 1 de octubre, 2025
- Plazo de presentación de ofertas: enero/febrero de 2026
- Inicio de la construcción: 1 de julio de 2026
- Finalización de la construcción: 1 de septiembre de 2026



Escuela primaria Taft

Puertas y rampa de la escuela

Proyecto

4



Escuela primaria Taft

Puertas de la escuela y

Proyecto de rampa

Gasto de capital para 2024

Proyecto

- Alcance del trabajo:
 - Sustitución de las puertas exteriores de la cocina y de salida de emergencia.
 - Instalación de nuevas rampas y aceras en las puertas.
- Aprobación del NYSED: Completa
- Subasta: Completada
- Construcción: del 1 de julio al 1 de septiembre de 2025



Cafetería de la escuela secundaria

Proyecto Windows

5



Escuela secundaria

Ventanas de la cafetería

Proyecto

Gasto de capital para 2025

Proyecto

- Alcance del trabajo:
 - Sustitución del exterior
 - Sistemas de ventanas para cafeterías.
 - Instalación de vidrios de privacidad.
- Aprobación del NYSED (prevista): 1 de octubre, 2025
- Plazo de licitación: noviembre/diciembre de 2025
- Construcción: del 1 de marzo al 1 de julio de 2026





CSARCH



Arris Contracting Company, Inc.

¿Preguntas?
